

Optimus Prime

Pipeline autonomo de release notes e sincronizacao
(versao em codigo, sem dependencia do Claude)

Documento de projeto e plano de construcao

Versao 1.0 · 27 de julho de 2026

Autor: Ronan Berto · Assistente: Optimus Prime

Sumario

- 1. Sumario executivo
- 2. Visao geral do sistema (D1)
- 3. Arquitetura em camadas (D2)
- 4. Fluxo da esteira (D3)
- 5. Regras de negocio (D4)
- 6. Governanca e seguranca (D5)
- 7. Roadmap de construcao (D6)
- 8. Passo 1 - Scaffold do repositorio
- 9. Passo 2 - Dominio puro (regras)
- 10. Passo 3 - Adapter Jira + parsers
- 11. Passo 4 - Coletor + Validador + CLI verificar
- 12. Passo 5 - Adapter Notion + Montador
- 13. Passo 6 - Sync bridge + Orquestrador + CLI executar
- 14. Passo 7 - Promocao guardada + agendador + docs
- 15. Apendice A - Contratos e configuracao
- 16. Apendice B - Casos-modelo de teste
- 17. Riscos e Definition of Done

1. Sumario executivo

Hoje o `workflow-automation-management` e um conjunto de instrucoes (skills em Markdown) que **so roda dentro do Claude Code**, com os MCPs Atlassian e Notion ligados por OAuth manual. Ele documenta releases no Notion e prepara a sincronizacao de branches acionando o `sync-repos-from-master`.

Este documento define um **gemeo autonomo**: o mesmo papel "Optimus Prime", porem em **codigo real**, rodando como **pipeline sem o Claude no meio**. O sistema atual e **preservado** (fica como a versao assistida por IA); criamos um **repositorio novo**, separado, espelhando a arquitetura limpa ja provada no `sync-repos-from-master`.

O que muda

Aspecto	Hoje (assistido por Claude)	Novo (pipeline autonomo)
Motor	Claude Code lendo skills	Codigo Python (Clean Architecture)
Jira / Notion	MCP + OAuth por pessoa	REST direto com token em <code>.env</code>
Disparo	Comando no chat	CLI + agendador (cron/systemd)
Card ambiguo	Pergunta ao humano	Exclui e reporta (deterministico, sem IA)


Deploy (sync)	make sob OK do Ronan	Igual: make run/master/triggers sob OK
---------------	----------------------	--

Premissas travadas

- Repositorio novo, **Python 3.14 + Poetry**, espelhando o `sync-repos-from-master`.
- Execucao por **CLI + agendador** (cron/systemd), com comando unico no estilo do Sync.
- **Card ambiguo** (heuristica so-banco nao fecha, ou repositorio diferente da PR) e **excluido e reportado** - 100% deterministico, sem chamada de IA em runtime.
- Gates humanos por **comando separado**: `executar` vai so ate o `make dry-run` do Passo 1 e emite a mensagem `Optimus Prime retornando com o resultado = Confira`; `make run`, master e triggers ficam guardados sob OK do Ronan.
- "Assignee de banco" deixa de ser conhecimento tacito e vira um cadastro `db_owners` na configuracao.

2. Visao geral do sistema


O "Optimus Prime" em codigo e o cerebro; os bracos continuam sendo Jira (leitura), Notion (escrita) e o `sync-repos-from-master` (deploy). O que antes exigia o Claude operando MCPs agora sao chamadas REST diretas e a orquestracao dos `make` do sync-tool.

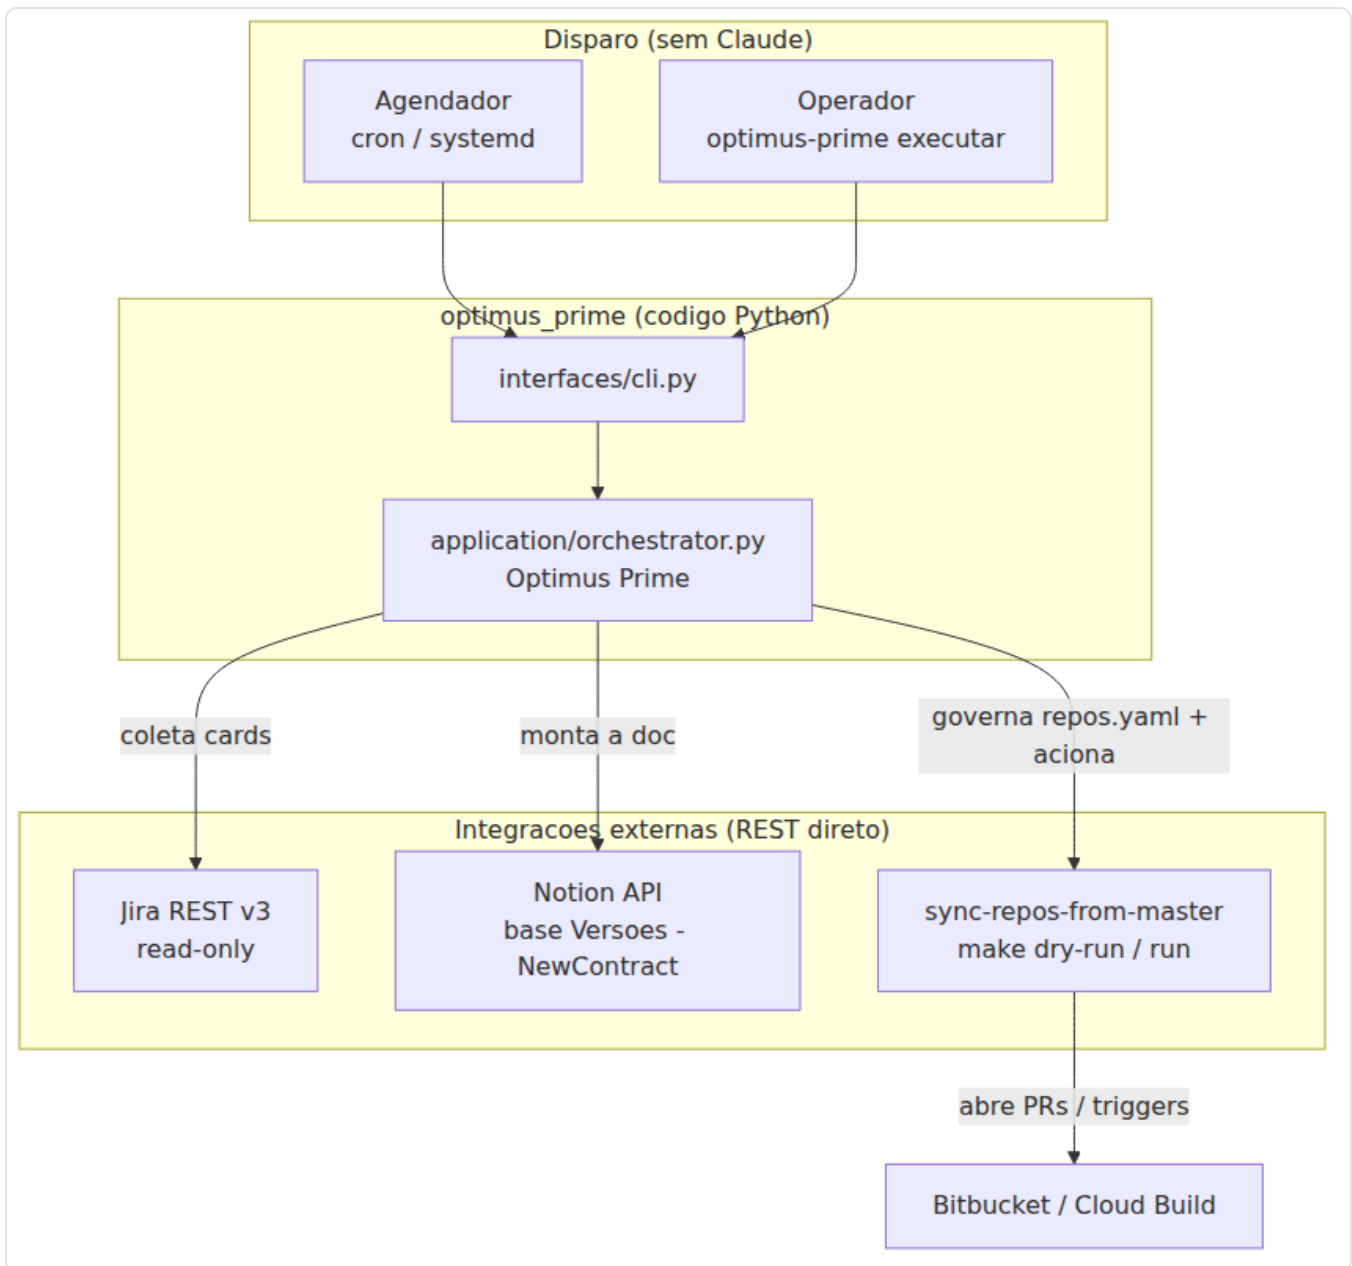

D1 - Visao geral: disparo (agendador/operador) -> Optimus Prime -> Jira / Notion / sync-tool.

3. Arquitetura em camadas

Clean/Hexagonal identica a referencia: direcao de dependencia `interfaces` → `application` → `domain` ← `infra`. O `domain` define contratos (ABCs) e regras puras sem I/O; o `infra` implementa os contratos (adapters REST); o `application` orquestra recebendo os contratos por injecao de dependencia.

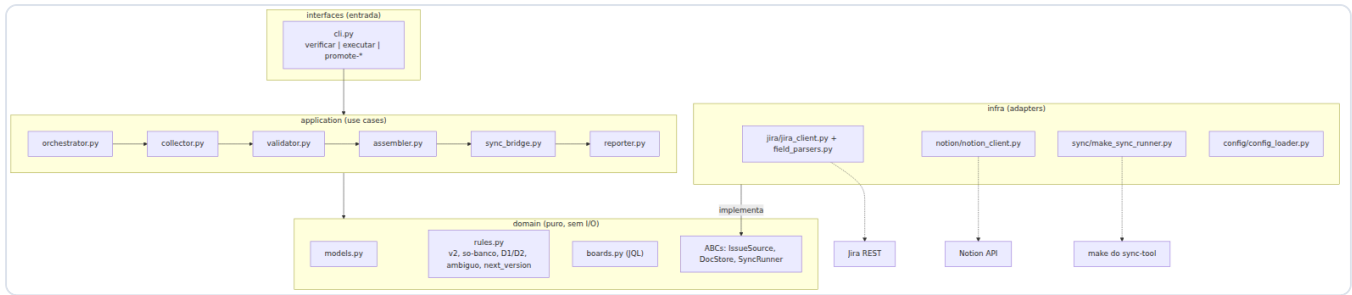


D2 - Camadas e módulos do pacote `optimus_prime`.

Padroes reusados do `sync-repos-from-master`: CLI com `argparse` e roteamento por primeiro argumento; `@dataclass(slots=True)` + `Literal` para status; `BaseAdapter.safe_call()` que converte falhas conhecidas em resultado normalizado sem quebrar o lote; adapters com `transport` injetavel (testaveis sem rede); saida `chave=valor` + exit code.

4. Fluxo da esteira


No `executar` de um board, a esteira roda de forma autonoma da coleta ate o `make dry-run` do Passo 1, encerrando na mensagem unica `Confira`. A unica execucao que interrompe e um erro; o card ambiguo nao pausa - e excluido e reportado.

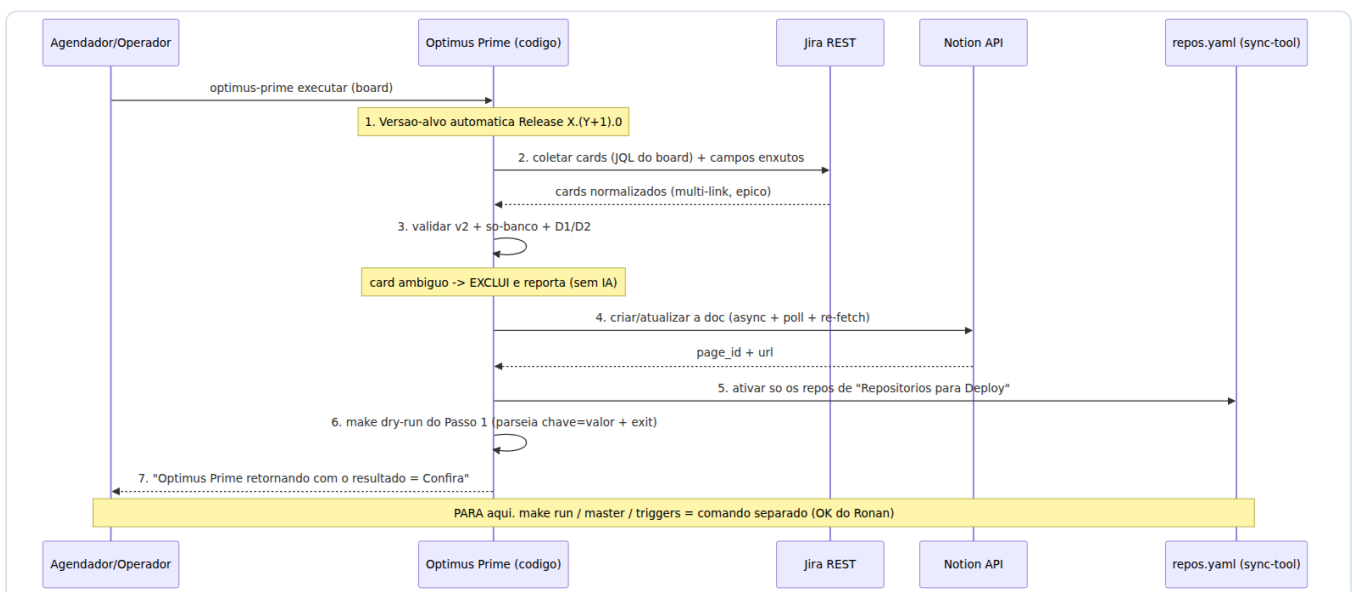


D3 - Sequencia dos passos 1 a 7; para no dry-run + Confira; make run e deploy sob OK do Ronan.

5. Regras de negocio

Toda a decisao de elegibilidade e dependencia vira codigo deterministico e testavel (camada `domain/rules.py`). A regra v2 (aprovar se tem PR+repositorio, ou se e legitimamente so-banco), a heuristica so-banco, e as regras de dependencia D1 (epico incompleto) e D2 (PR compartilhada parcial) sao aplicadas em sequencia; o card ambiguo e excluido e reportado.

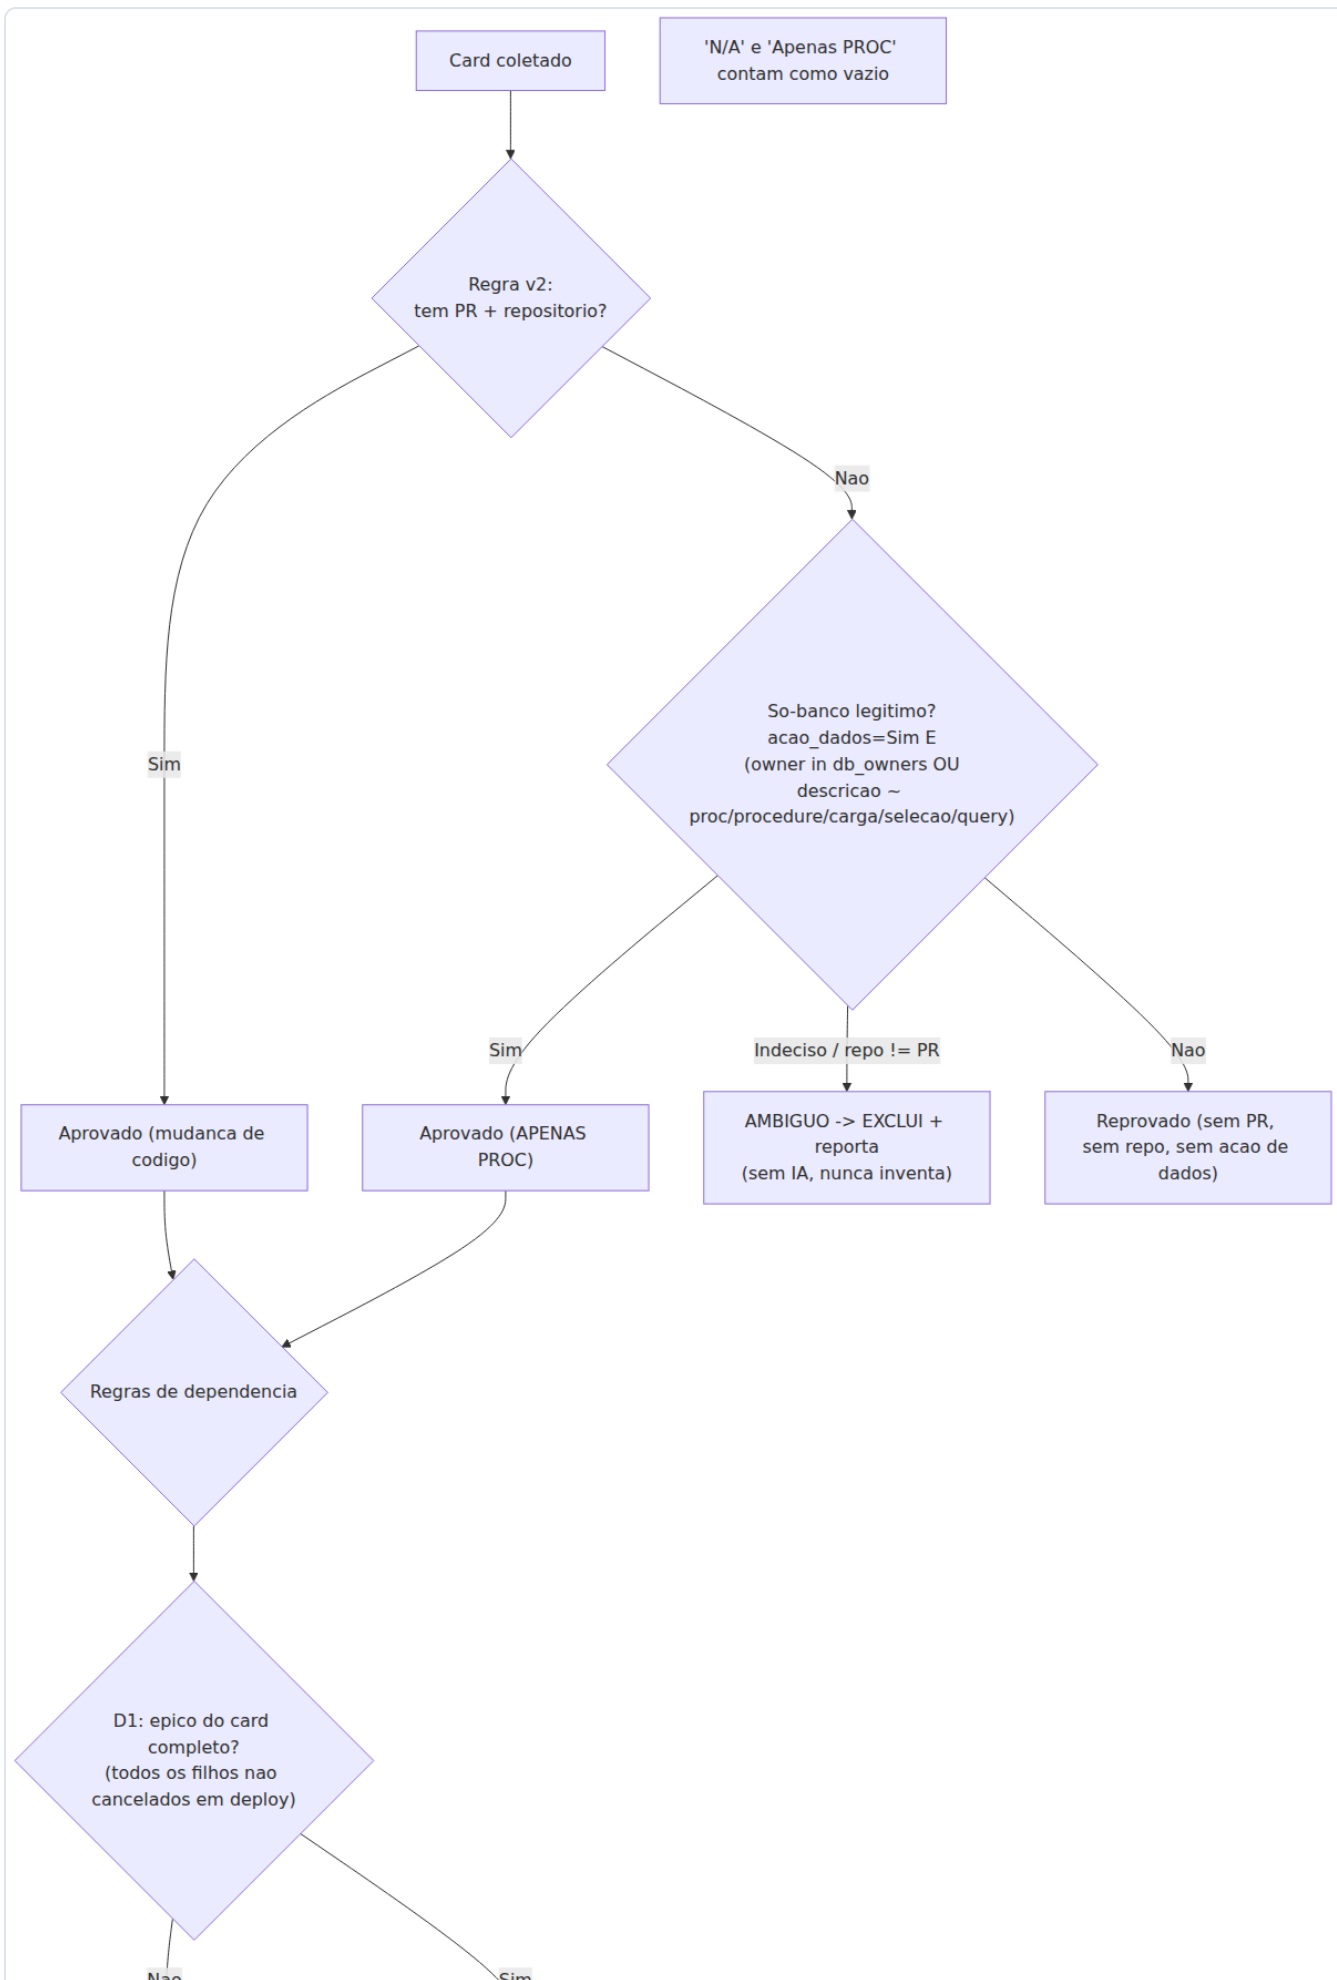

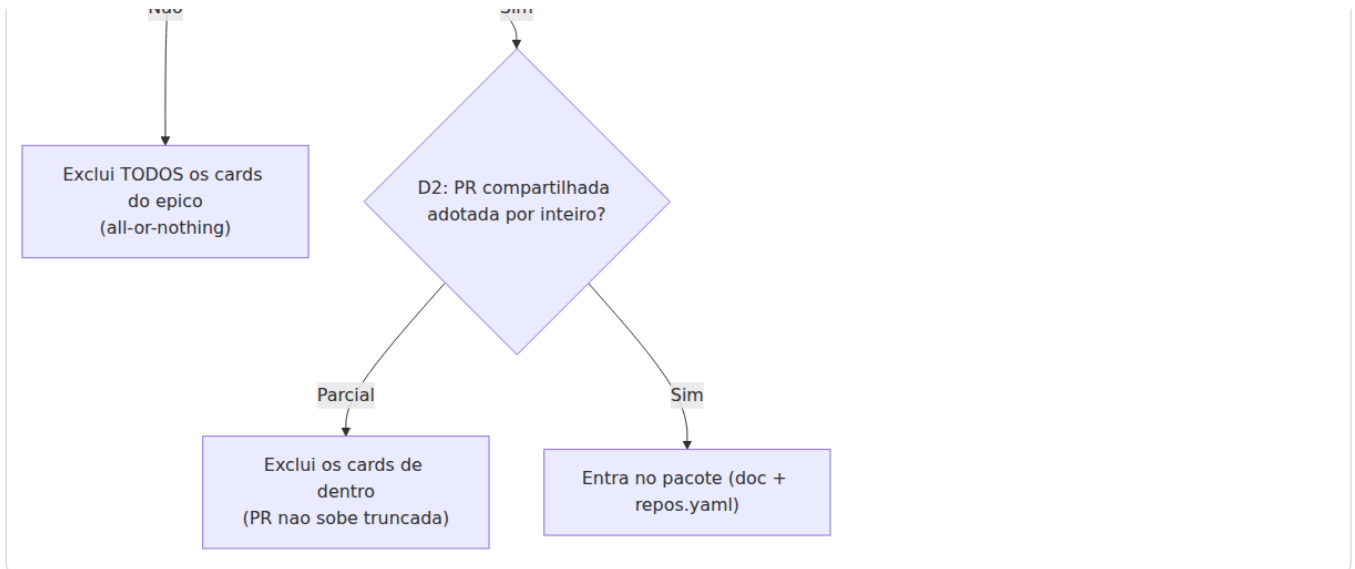

D4 - Elegibilidade v2 + so-banco + D1/D2 + tratamento deterministico do card ambiguo.

6. Governanca e seguranca


A fronteira de autonomia e clara: tudo ate o `make dry-run` do Passo 1 roda sozinho; todo `make run` (Passo 1 e 2), o merge, o master e as triggers (Passo 3) exigem OK explicito do Ronan. O `auto_merge` permanece `false`; o `make run` sempre com `target` explicito, nunca direto para a master.



D5 - O que e autonomo vs. o que fica sob OK do Ronan; invariantes inquebraveis.

7. Roadmap de construcao

A construcao e dividida em sete Passos sequenciais. O **Passo 4** entrega o primeiro valor real (le e valida cards sem escrever nada) e o **Passo 6** completa a esteira autonoma.



D6 - Sequencia dos Passos 1 a 7 e os dois marcos de valor.

Passo 1 - Scaffold do repositório

Objetivo

Criar o repositório novo com o esqueleto de Clean Architecture, ferramentas de qualidade e configuração, espelhando o `sync-repos-from-master`. Nenhuma regra ainda; só a fundação.

Subtarefas

- ☐ Criar o repo `workflow-automation-pipeline` (nome ajustável) e o pacote `src/optimus_prime`.
- ☐ `pyproject.toml` (Poetry, Python 3.14): `pyyaml`; dev: `pytest`, `pytest-cov`, `ruff`, `black`.
- ☐ Layout de pastas: `interfaces/` `application/` `domain/` `infra/` `shared/` `tests/`.
- ☐ `Makefile`: `alvos` `setup` `lint` `format` `test` `verificar` `executar` `executar-todos` `promote-passol` `promote-master` `triggers`.
- ☐ `.env.example`, `pipeline.yaml.example`, `deploy_requirements.yaml`.
- ☐ Hook `.githooks/pre-commit` (`deps-check` + `test` com cobertura mínima 80%); `ruff`+`black` configurados.

Entregáveis

Repo instalável (`make setup`), `make test` verde vazio, `lint/format` limpos.

Critério de conclusão: `make setup` e `make test` rodam sem erro; estrutura de camadas criada; hook de pre-commit ativo.

Dependências: nenhuma.

Passo 2 - Dominio puro (regras)

Objetivo

Codificar todo o "cerebro de decisao" como funcoes puras e modelos, sem nenhum I/O - a parte mais critica e a que ganha os testes mais fortes.

Subtarefas

- ☐ `domain/models.py`: `Card`, `Links` (repositories e `pull_requests` como listas), `DeployFields`, `Epic`, `ValidationResult`, `ReleaseDoc`, `ExecutionSummary`.
- ☐ `domain/boards.py`: registro dos 3 boards com a JQL exata (incidentes 1o).
- ☐ `domain/rules.py`: `eligibility_v2`, `so_banco_legitimo`, `is_ambiguous`, `d1_epico_incompleto`, `d2_pr_parcial`, `next_version`.
- ☐ Tratar "N/A" e "Apenas PROC" como vazio; deduplicar links.
- ☐ Testes dos casos-modelo (ver Apendice B): PB-5778, PB-5599, PB-5159, PB-5768, D1, D2, ambiguo.

Entregaveis

Modulo `domain` completo e coberto por testes; zero dependencia de rede.

Criterio de conclusao: todos os casos-modelo passam; cobertura do `domain` proxima de 100%.

Dependencias: Passo 1.

Passo 3 - Adapter Jira + parsers

Objetivo

Falar com o Jira por REST direto (o que hoje o MCP faz), normalizando cada card no contrato do dominio, com atencao ao multi-link e a PR-por-referencia.

Subtarefas

- ☐ `infra/jira/jira_client.py`: `urllib` + `transport` injetavel; auth Basic (email:token); `search` por JQL e `get issue` pedindo so os campos necessarios.
- ☐ `infra/jira/field_parsers.py`: extrair TODOS os URLs de `customfield_12399 / 12400`; deduplicar; resolver "Pr no card PB-XXXX" herdando PR/repo.
- ☐ Ler o `parent` (epico) e, para D1, os filhos do epico e seus status.
- ☐ Implementar a ABC `IssueSource` do dominio.
- ☐ Testes com `transport` fake (respostas Jira gravadas) - sem rede.

Entregaveis

Adapter Jira testado que devolve `Card` s normalizados a partir de respostas reais gravadas.

Criterio de conclusao: dado um payload Jira de exemplo, o adapter produz o card normalizado correto (multi-link e PR-por-referencia inclusos).

Dependencias: Passo 2.

Passo 4 - Coletor + Validador + CLI verificar

Objetivo

Primeiro marco de valor real: ler e validar cards de um board de verdade, **sem escrever nada**.

Subtarefas

- ☐ `application/collector.py` : monta a JQL do board, chama o `IssueSource` , normaliza.
- ☐ `application/validator.py` : aplica v2 + so-banco + D1/D2; separa aprovados/reprovados/excluidos/ambiguos.
- ☐ `application/reporter.py` : relatorio `chave=valor` + `ExecutionSummary` em `execucoes/` .
- ☐ `interfaces/cli.py` : comando `verificar BOARD=<board>` (dry, so leitura).

Entregaveis

`make verificar BOARD=incidentes` lista cards normalizados e a separacao de decisao, contra o Jira real, sem tocar em Notion nem no YAML.

Criterio de conclusao: o `verificar` roda fim-a-fim de leitura e o resultado bate com a conferencia manual de um pacote conhecido.

Dependencias: Passo 3.

Passo 5 - Adapter Notion + Montador

Objetivo

Escrever/atualizar a pagina da versao no Notion no molde padrao, de forma idempotente.

Subtarefas

- ☐ `infra/notion/notion_client.py` : query da ultima versao (`data_source`), criar/atualizar pagina; escrita assincrona com poll + re-fetch de verificacao.
- ☐ Implementar a ABC `DocStore` .
- ☐ `application/assembler.py` : versao-alvo `X.(Y+1).0` ; tabela (Item, Pull Requests, Banco, Infra, Merge); blocos fixos (Testes, Ambientes, Repositorios para Deploy, Participantes); todos os links por card.
- ☐ Idempotencia: se a pagina da versao existe, atualiza (nao duplica).
- ☐ Testes do montador com `DocStore` fake; testes do adapter com `transport` fake.

Entregaveis

Pagina montada corretamente na base de teste do Notion (`1.111.0 (teste)`).

Risco: a tabela do Notion via API sao blocos - e a integracao mais complexa. Ganha um modulo de template dedicado e testes proprios.

Dependencias: Passo 4.

Passo 6 - Sync bridge + Orquestrador + CLI executar

Objetivo

Fechar a esteira autonoma: governar o `repos.yaml`, rodar o `make dry-run` do Passo 1 e emitir a mensagem `Confira`.

Subtarefas

- ☐ `infra/sync/make_sync_runner.py`: editar o `repos.yaml` em `$SYNC_REPO_PATH` (ativar so os repos de "Repositorios para Deploy", triggers comentados, resto comentado, repo faltando -> para e reporta); `subprocess` do `make dry-run`; parsear `chave=valor` + exit code.
- ☐ Implementar a ABC `SyncRunner`.
- ☐ `application/orchestrator.py`: encadeia versao-alvo -> coletor -> validador -> montador -> sync bridge (dry-run) -> relatorio.
- ☐ `interfaces/cli.py`: executar `BOARD=<board>` e `executar-todos`; emite a linha `Confira` + artefatos; grava `execucoes/`.
- ☐ Erros -> post-mortem `erros/AAAA-MM-DD-slug.md`.

Entregaveis

`make executar BOARD=incidentes` vai da coleta ao dry-run e encerra na mensagem `Confira`, sem abrir nenhum PR.

Criterio de conclusao: esteira completa autonoma ate o dry-run; `execucoes/` gravado; nenhum `make run` disparado sozinho.

Dependencias: Passo 5.

Passo 7 - Promocao guardada + agendador + docs

Objetivo

Entregar os comandos de promocao sob OK do Ronan, o agendamento e a documentacao do novo repo.

Subtarefas

- ☐ `make promote-passo1 VERSAO=...` (make run que abre os PRs pre-prod), `promote-master` (Passo 2), `triggers` (Passo 3) - todos guardados.
- ☐ Garantir `auto_merge=false` e `target` explicito sempre.
- ☐ Unit `systemd` (ou cron) chamando `make executar-todos` no horario definido.
- ☐ `README` + `spec` do novo repo (estilo do sync-tool); opcional: nota no repo atual apontando para o pipeline.

Entregaveis

Promocao funcional sob comando; agendamento ativo; documentacao publicada.

Criterio de conclusao: `promote-passo1` abre os PRs (`auto_merge=false`); o agendador dispara o `executar-todos` ; docs completas.

Dependencias: Passo 6.

Apendice A - Contratos e configuracao

Card normalizado (contrato de saida do coletor)

Campo	Tipo	Observacao
card_id / title / issue_type / status	string	identidade do card
owner	{name, account_id}	assignee
product	string	customfield_11993
epic	{key, summary}	parent (para D1)
links.repositories	lista de string	customfield_12399 - todos os links
links.pull_requests	lista de string	customfield_12400 - todos os links
deploy_fields.acao_dados	Sim/Nao	customfield_12297
deploy_fields.merge_realizado	null	customfield_12401 (hoje vazio)
deploy_fields.apenas_proc / proc_name	bool / null	a extrair da descricao (backlog)

Identificadores e integracoes

Item	Valor
Jira site / cloudId	bernhoeft.atlassian.net / f36e5519-1f88-4f71-a406-75326e86deda
Projeto / escopo	PB / read:jira-work (read-only)
Customfields	12399 repo, 12400 PR, 12297 acao dados, 12401 merge, 11993 produto
Notion data_source	23e19d89-2318-81ff-812d-000b6afb6b5a (props: Versao title, Tipo select)
Molde / base de teste	pagina 1.110.0 / 1.111.0 (teste)
Sync tool	\$SYNC_REPO_PATH (default ../sync-repos-from-master)

Variaveis de ambiente (.env)

Variavel	Uso
JIRA_EMAIL / JIRA_TOKEN	auth Basic no Jira REST
NOTION_TOKEN	Bearer na API do Notion

SYNC_REPO_PATH	caminho do sync-repos-from-master
----------------	-----------------------------------

JQL por board

Prioridade	Board	JQL
1	Incidentes	project = PB AND issuetype = Incidente AND status in ("Teste regressivo","Pronto para deploy")
2	Features	project = PB AND issuetype = Story AND summary !~ "Refatoracao" AND status in (...)
3	Refatoracao	project = PB AND issuetype = Story AND summary ~ "Refatoracao" AND status in (...)

Apendice B - Casos-modelo de teste

Caso	O que valida	Resultado esperado
PB-5778	So-banco legitimo (assignee de banco, descricao cita procedure, sem PR/repo)	Aprovado (APENAS PROC)
PB-5599	PR-por-referencia (herda PR de PB-5651)	Aprovado (PR herdada conta)
PB-5159	Filhos do mesmo epico compartilham as mesmas 3 PRs	PRs deduplicadas (contam uma vez)
PB-5768	Epico all-or-nothing (38 filhos) incompleto	D1: exclui todos os cards do epico
D1 generico	Irmão do epico ainda em dev	Exclui o epico do pacote
D2 generico	PR compartilhada adotada parcialmente	Exclui os cards de dentro
Ambiguo	Repositorio diferente da PR, ou so-banco indeciso	Exclui + reporta (sem IA)
N/A / Apenas PROC	Valores tratados como vazio	Nao contam como link valido

Riscos e Definition of Done

Riscos

- **Tabela do Notion via API** (blocos + escrita assincrona) e a integracao mais complexa - mitigada por modulo de template dedicado, uso da base de teste primeiro e re-fetch de verificacao.
- **Grafia exata das branches** (`prerelease` / `teste_regressivo` / `master`) a confirmar antes do run real.
- **Campos sem fonte deterministica** (Acao de Infra inexistente, Merge vazio, nome do proc) - ficam em branco, nunca inventados.
- **Cadastro** `db_owners` precisa ser mantido atualizado (quem e responsavel de banco).

Definition of Done do projeto

- ☐ `make executar BOARD=<board>` roda sem Claude, da coleta ao dry-run, e emite `Confira`.
- ☐ Regras (v2, so-banco, D1/D2, ambiguo) cobertas por testes; cobertura minima 80%.
- ☐ Notion montado corretamente e idempotente; `repos.yaml` governado a partir da doc.
- ☐ Promocao (`make run /master/triggers`) so sob OK do Ronan; `auto_merge=false`.
- ☐ Agendador ativo; documentacao publicada; repo atual preservado.
